

三芳スマートIC 安全対策箇所図

対応策	実施主体
短: 路面標示の補修・強調 (R4年度予定) 長: 規制標識移設 (R3年度済)	警察・ふじみ野市 警察


対応策	実施主体
短: 注意看板の設置 (R4年度予定) 短: 車道外側線の変更 (R4年度予定) 中: 障害物撤去、移設	警察・ふじみ野市 埼玉県 ふじみ野市

対応策	実施主体
短: 注意看板の設置 (R1年度済) 長: 信号の歩車分離	埼玉県 警察

対応策	実施主体
短: 交差点中心点標示設置 (R5年度予定) 短: 車道外側線の設置 (R2年度済) 短: 交差点カラー化 (R2年度済) 短: 注意看板の設置 (R4年度予定) 長: 隅角部半径の改良 長: 自転車レーン整備	ふじみ野市・三芳町

対策実施中箇所(実施主体:三芳町)	
対応策	箇所
交差点(南・西)に右折レーン設置 R2年3月済 (※ふじみ野市の意向により東側右折レーンも設置 R2年3月済)	C
交差点(北・西)に右折レーン設置 H31年3月済	B
交差点(北・南・東)に右折レーン設置 県: 交差点(北・南) 事業中 町: 交差点(東) R2年3月済 ※区画線未施工	A
片側歩道整備 R2年3月済 歩道橋設置 下部工施工中	A-B
交差点(北・東)に右折レーン設置 H31年3月済	D

対応策	実施主体
短: 注意看板の設置 (R2年度済) 短: ガードレールの補修 (H30年度済)	埼玉県 埼玉県

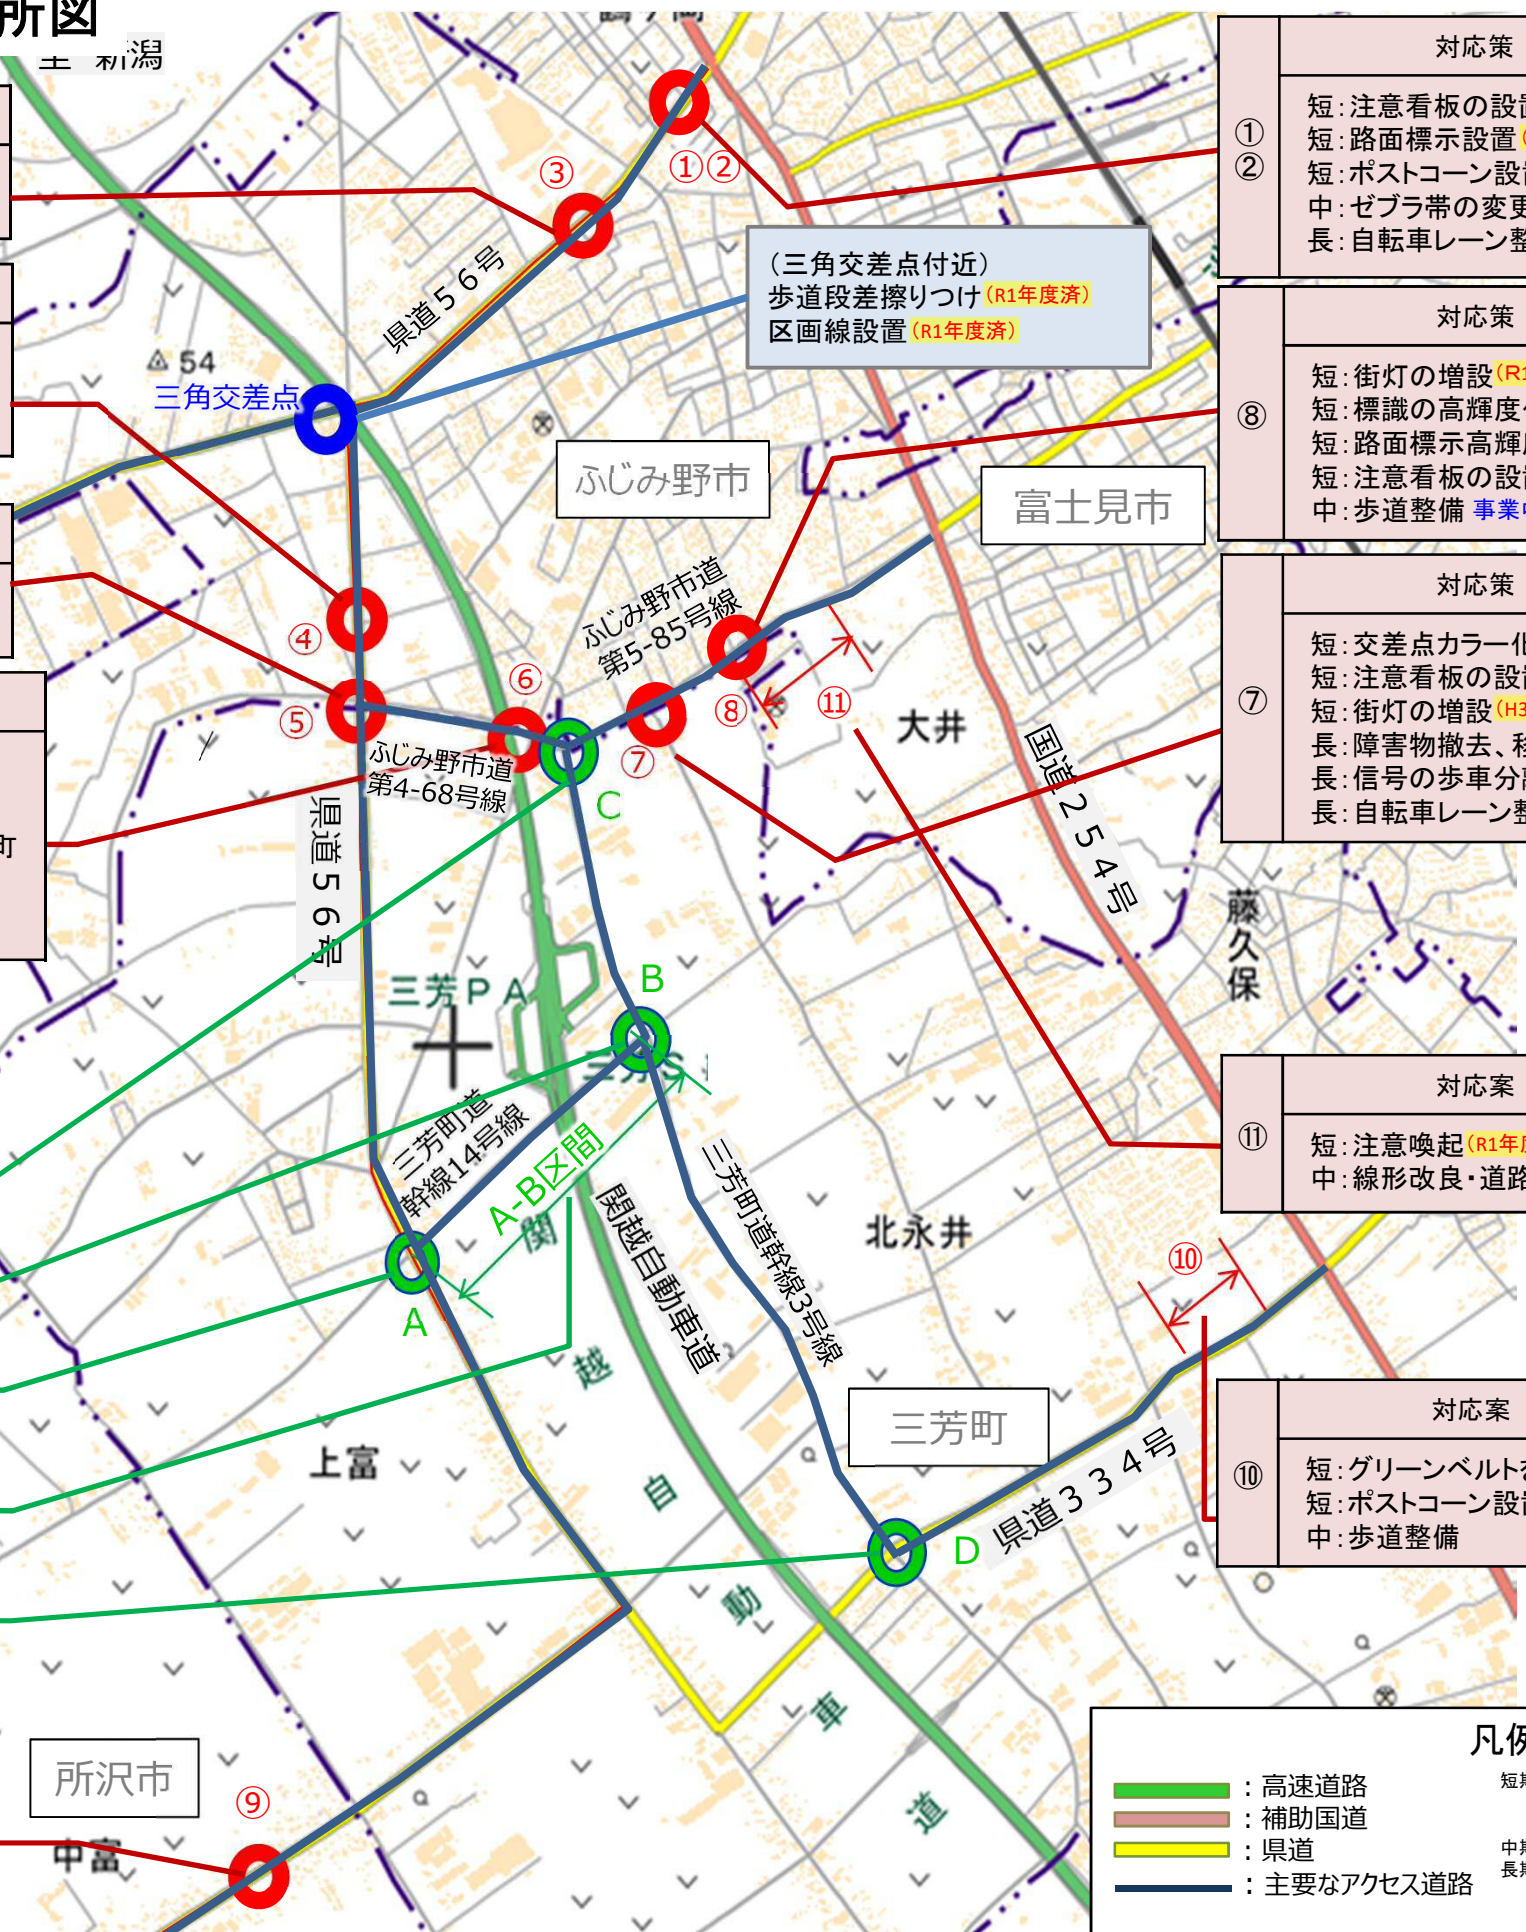

(三角交差点付近)
歩道段差擦りつけ (R1年度済)
区画線設置 (R1年度済)

対応策	実施主体
短: 注意看板の設置 (R5年度予定) 短: 路面標示設置 (R3年度済)	県・ふじみ野市 警察
短: ポストコーン設置 (H30年度済) 中: ゼブラ帯の変更 長: 自転車レーン整備	埼玉県 埼玉県 埼玉県・ふじみ野市

対応策	実施主体
短: 街灯の増設 (R1年度済) 短: 標識の高輝度化 (H26年度済) 短: 路面標示高輝度化 (H26年度済) 短: 注意看板の設置 (R1年度済) 中: 歩道整備 事業中	ふじみ野市 警察 警察 ふじみ野市 ふじみ野市・三芳町

対応策	実施主体
短: 交差点カラー化 (R4年度予定) 短: 注意看板の設置 (R2年度済) 短: 街灯の増設 (H30年度済) 長: 障害物撤去、移設 長: 信号の歩車分離 長: 自転車レーン整備	ふじみ野市・三芳町 ふじみ野市・三芳町 ふじみ野市 三芳町 警察 ふじみ野市

対応策	実施主体
短: 注意喚起 (R1年度済) 中: 線形改良・道路拡幅 事業中	ふじみ野市・三芳町

対応策	実施主体
短: グリーンベルトを整備 (H28年度済) 短: ポストコーン設置 (R5年度予定) 中: 歩道整備	埼玉県

凡例

- 高速道路
- 補助国道
- 県道
- 主要なアクセス道路

短期対策: (スマートICフル化供用まで)
早急に実施可能な対策として、スマートIC開通までに実施

中期対策: スマートIC開通後概ね5年を目途に着手

長期対策: 開通後の交通状況をふまえて、関係機関事務打合せを行い検討のうえ判断し、準備が整い次第着手
